



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

I diritti di proprietà inerenti il presente elaborato, nonché ogni relativa integrazione, rimangono in capo al tecnico firmatario. Eventuali modifiche e/o aggiunte allo stesso saranno, esclusivamente, di proprietà di quest'ultimo. E' fatto divieto a chiunque di riprodurre, copiare o comunque utilizzare e/o consegnare, senza preavviso, a terzi i grafici originali o loro copie, nonché gli schemi parziali e quant'altro di cui alla presente fornitura.

**OGGETTO:** LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N° 48

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**A L L E G A T I**

**10) CRONOPROGRAMMA**

**STAZIONE APPALTANTE**

Provincia di Benevento

**Il Progettista**

Arch. Giancarlo MARCARELLI

**Il Responsabile del Procedimento**

Arch. Angelo DE BLASIO

**Il Responsabile Servizio Viabilità 2**

Ing. Michelantonio PANARESE

**Il Dirigente**

Ing. Angelo Carmine GIORDANO




Timbro e Firma

**TAV**

**10**

**L' IMPRESA**

Timbro e Firma

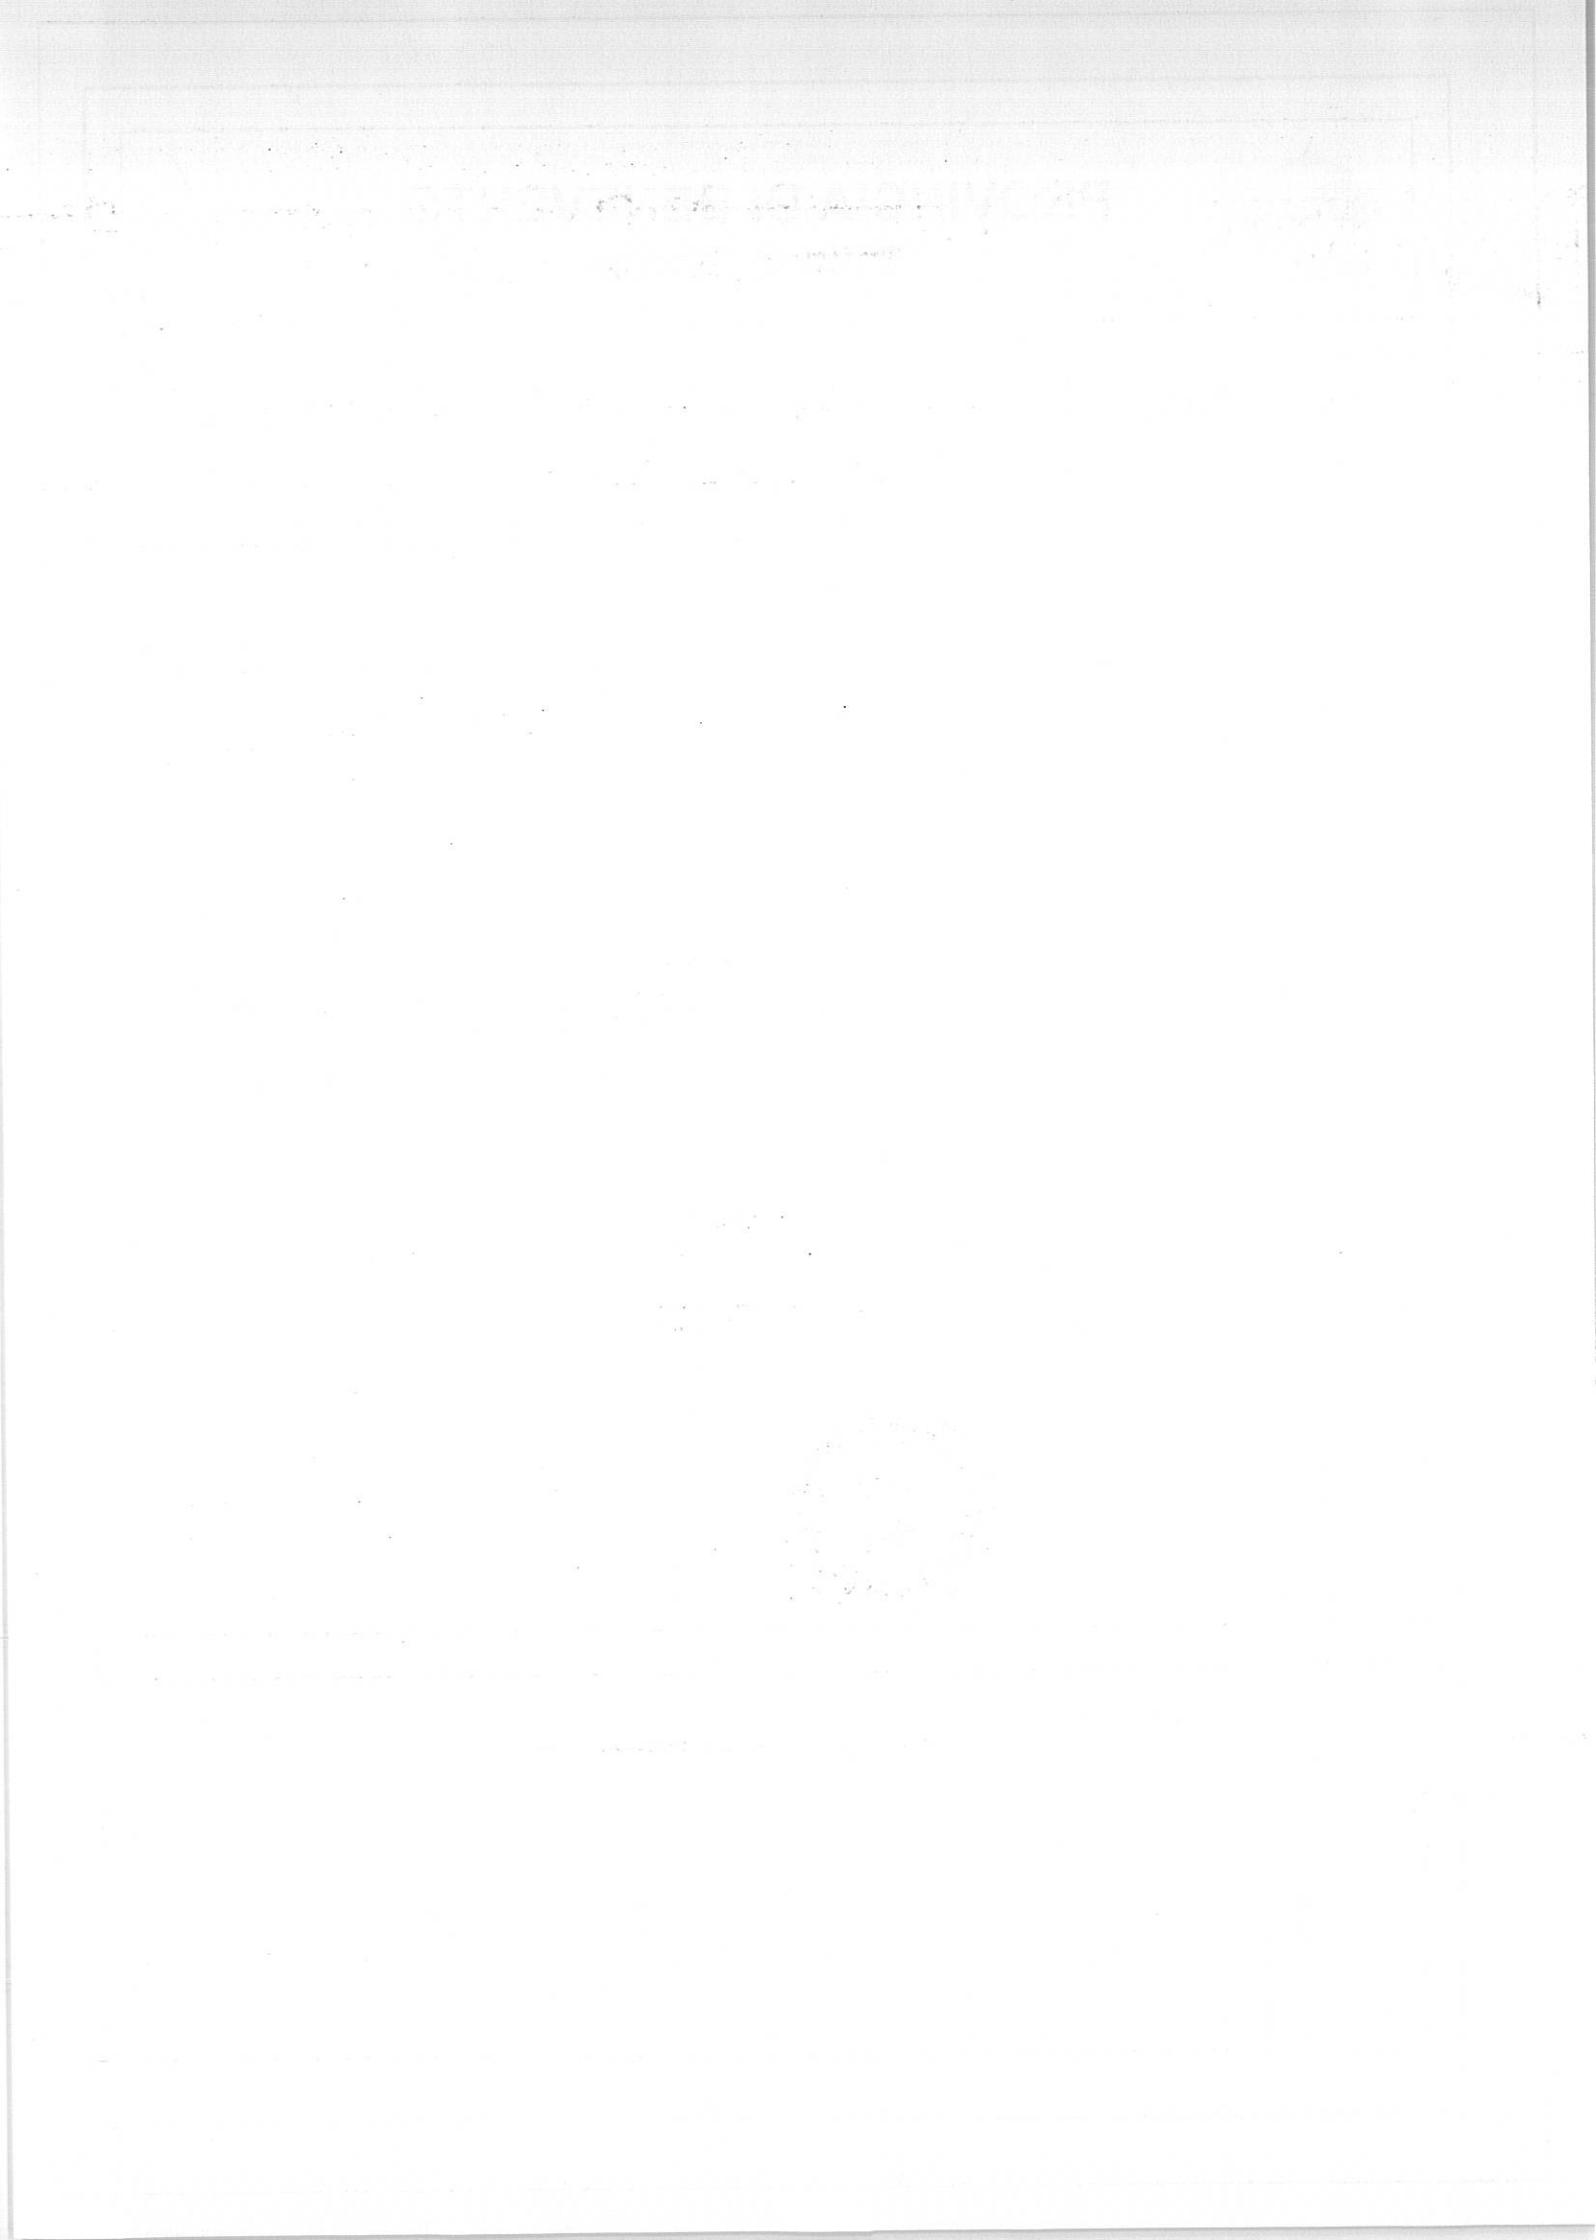

# ALLEGATO "A"

**Comune di Castelfranco**  
Provincia di BN

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di riassetto, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 48 - 2° tratto" Castelfranco in M. - Confine provincia di Foggia".  
**COMMITTENTE:** Provincia di Benevento  
**CANTIERE:** S.P. N°48, Castelfranco (BN)

Benevento, 04/03/2021

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
  
(architetto Marcarelli Giancarlo )  
*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

(Dirigente Settore Tecnico Giordano Ing. Angelo Carmine )

**architetto Marcarelli Giancarlo**

Largo. G. Carducci  
82100 Benevento (Bn)  
Tel.: 0824774291 - Fax: 0824774215  
E-Mail: giancarlo.marcarelli@provincia.benevento.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

Tabella Analitica Gantt

gg L	data Iniziale	data Finale	FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
			Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/07/2021	01/07/2021
			fresatura pavimentazione stradale	1	E	67	96	05/08/2021	08/11/2021
			sistemazione piano viabile	1	E	41	57	01/07/2021	26/08/2021
			pavimentazione piano viabile	1	E	74	106	13/09/2021	27/12/2021
			Barriere stradali	1	E	74	106	13/09/2021	27/12/2021
			smobilizzo cantiere	1	E	1	1	30/12/2021	30/12/2021

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro





06 Set 21					13 Set 21					20 Set 21					27 Set 21					04 Ott 21					11 Ott 21					18 Ott 21																													
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
																									67																																		
Z1																														74																													
Z1																														74																													

25 Ott 21			01 Nov 21			08 Nov 21			15 Nov 21			22 Nov 21			29 Nov 21			06 Dic 21																													
23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09
																		67																													
																		74																													
																		74																													
[Grid area]																																															



